

「RicePaper」の由来…
当工事の担当課「稲敷工事区」の「稲(RicePlant)」と、
本お便りの「紙(Paper)」を組み合わせ、「RicePaper」
といます。

NEXCO東日本つくば工事事務所稲敷工事区です。いつもご協力ありがとうございます。このお便りは、圏央道4車線化事業でどのような工事を行っているのか、概要や様子をみなさまにお届けできればと考え、作成しました。

令和4年度より圏央道近傍で、沼田橋、江戸崎橋周辺の工事用道路を造成から始まり、現在は、「土工工事」から「舗装工事・施設工事」への引渡しまでが完了しております。



現在は、「舗装工事」で現地測量および路盤準備工を終え、用排水構造物工（排水溝、集水ます等の設置）を進めております。

引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

舗装の構造・横断構成

土工部		車線部	
舗装厚 t=40cm (単位:cm)			
路肩部	厚	表層(高機能舗装Ⅱ型)	厚
表層(高機能舗装Ⅱ型)	4	表層(高機能舗装Ⅱ型)	4
基層	6	基層	6
上/下層路盤(製鋼スラグ)	30	上層路盤(HIMA)	15
		下層路盤(製鋼スラグ)	15
			40

橋梁部	
舗装厚 t=8cm (単位:cm)	
表層(高機能舗装Ⅱ型)	厚
表層(高機能舗装Ⅱ型)	4
レベリング層	4
	8

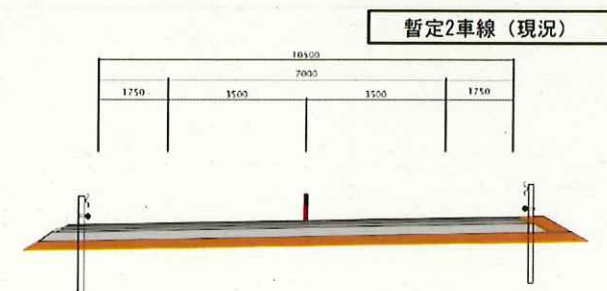

3工区現地写真



4工区現地写真

1～4工区で、舗装工事への引渡しまでの施工が完了し、舗装工事にて現地測量および路盤準備工を終え、用排水構造物工（排水溝、集水ます他の設置）の施工を進めております。

私達が工事用車両を誘導します。
みなさまの安全が第一です！



お問い合わせ先
NEXCO東日本
つくば工事事務所
舗装第二工事班
稲敷工事区
電話：029-836-7755

2026年1月版

「RicePaper」の由来…
当工事の担当課「稲敷工事区」の「稲(RicePlant)」と、
本お便りの「紙(Paper)」を組み合わせ、「RicePaper」
といます。


NEXCO東日本つくば工事事務所稲敷工事区です。いつもご協力ありがとうございます。このお便りは、圏央道4車線化事業でどのような工事を行っているのか、概要や様子をみなさまにお届けできればと考え、作成しました。

令和4年度より圏央道近傍で、沼田橋、江戸崎橋周辺の工事用道路を造成から始まり、現在は、江戸崎橋で、「橋りょう上部工工事」を行っております。

今後は江戸崎橋では、床版施工のための型枠・鉄筋の配筋・コンクリート打設等を進めていきます。

引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

橋りょうの構造

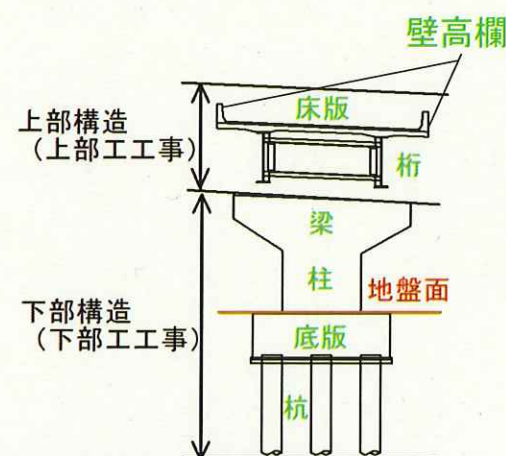

江戸崎橋



進捗状況
(完了数/全体数)
下部工工事 21/21基
※下部工構築完了


上部工工事 0/2連

撮影：NEXCO東日本（2026年1月）

施工状況 (橋りょう上部工工事)



鉄筋の配筋状況

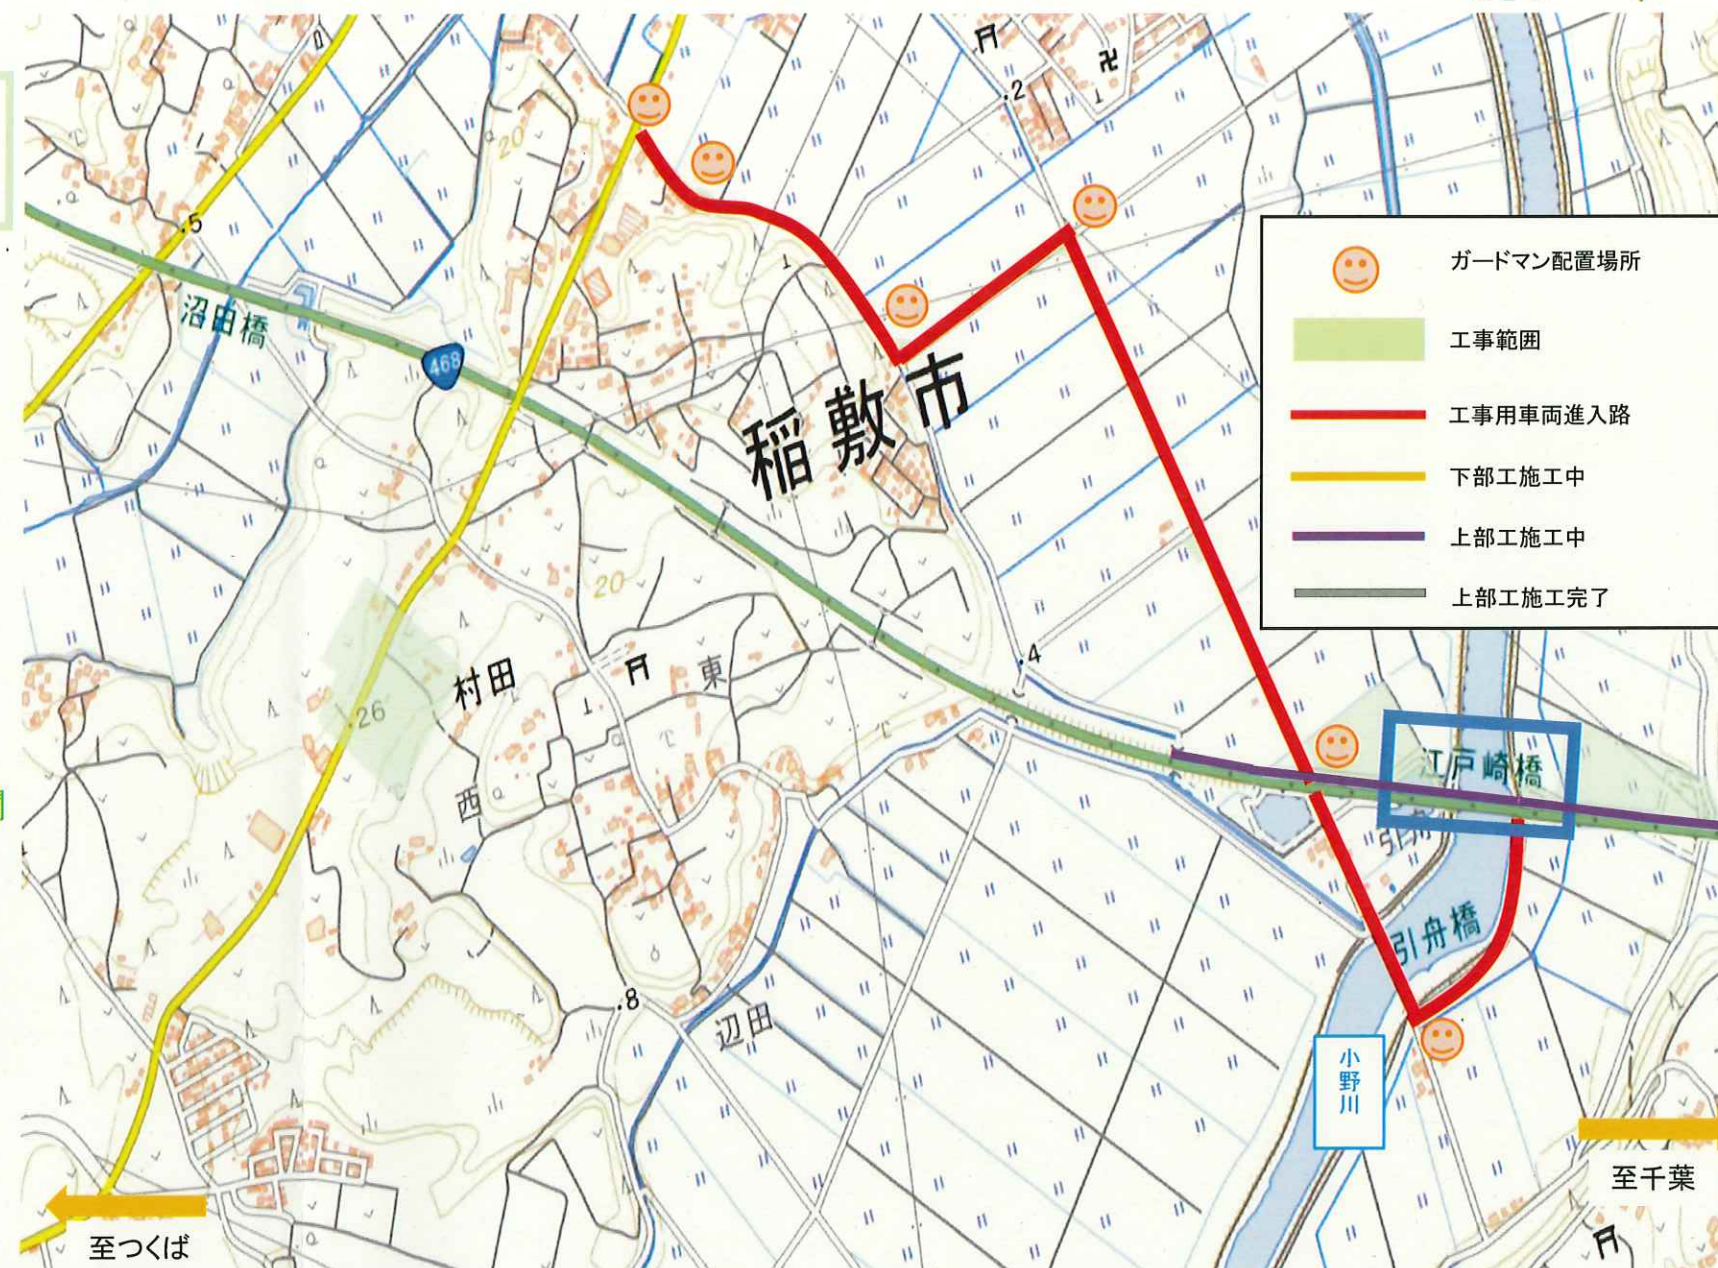

お問い合わせ先
NEXCO東日本
つくば工事事務所
稲敷工事区
電話：029-836-7755

2026年1月版

RicePaper

新利根川 版

NEXCO東日本
つくば工事事務所

回 覧

「RicePaper」の由来…
当工事の担当課「稲敷工事区」の「稲(RicePlant)」と、
本お便りの「紙(Paper)」を組み合わせ、「RicePaper」
といます。


NEXCO東日本つくば工事事務所稲敷工事区です。いつもご協力ありがとうございます。このお便りは、圏央道四車線化事業でどのような工事を行っているのか、概要や様子をみなさまにお届けできればと考え作成しました。

令和3年度より圏央道本線の霞ヶ浦側で、工事用道路の造成から始まり、現在は「橋りょう上部工工事」を行っております。

「橋りょう上部工工事」では、床版コンクリート及び壁高欄の施工が完了し、今後は橋梁付属物等の施工を行っていきます。

引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

橋りょうの構造

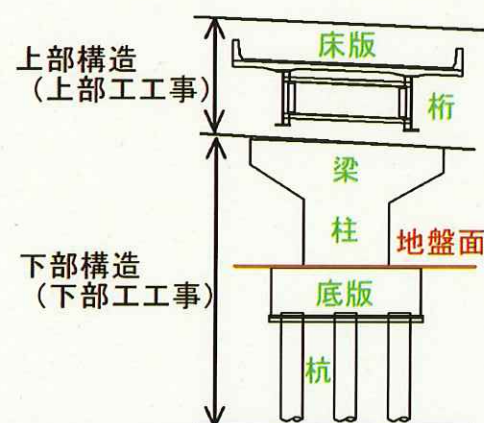

新利根川橋



進捗状況 (R8.1現在)


(完了数/全体数)

下部工工事 54/54基

上部工工事 4/9連

撮影: NEXCO東日本 (2026年1月)

圏央道四車線化事業の様子をみなさまにお届けします!

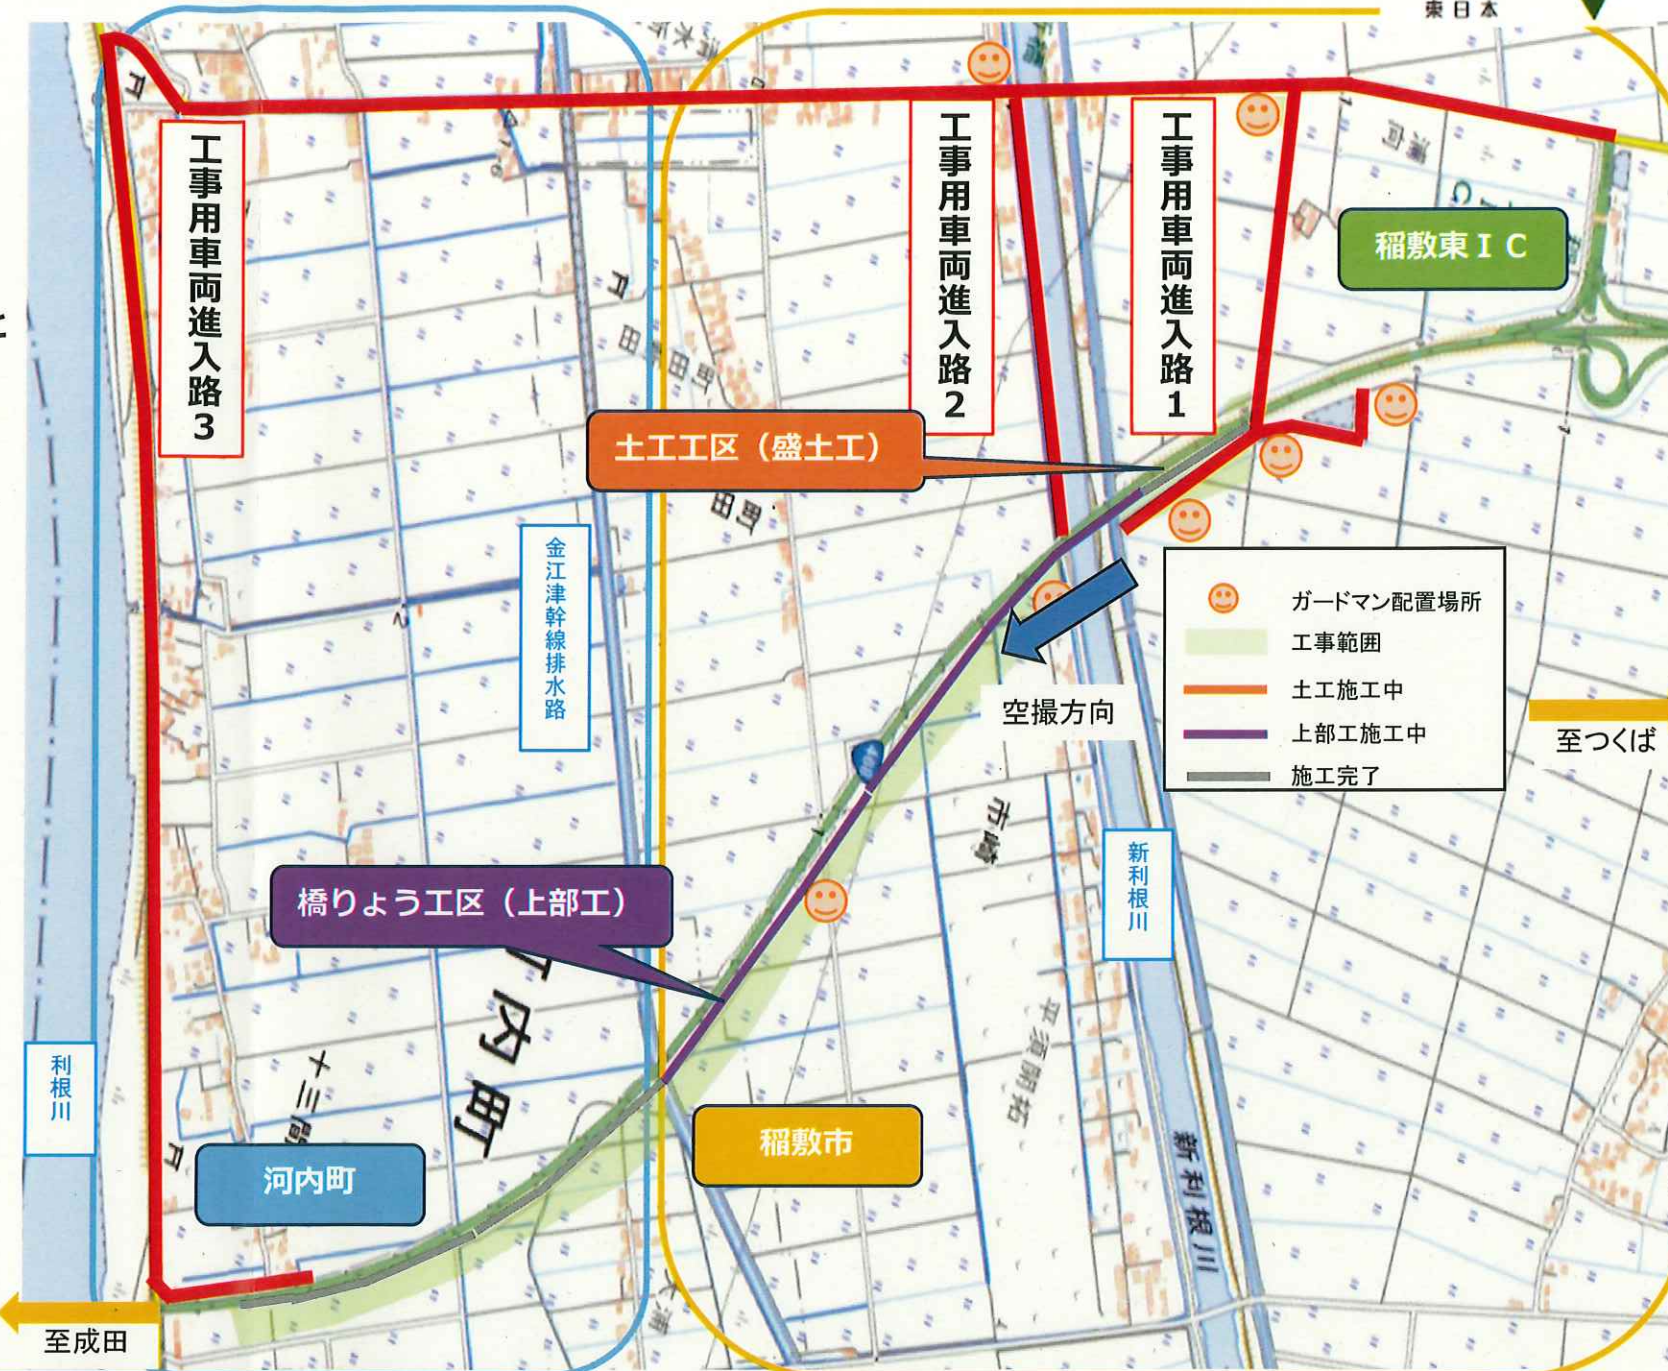

壁高欄施工状況 (橋りょう上部工工事)



コンクリート打設作業の状況

お問い合わせ先
NEXCO東日本
つくば工事事務所
稲敷工事区
電話: 029-836-7755

2026年1月版
