

CV55-3^C×2 (100) FEP
CVT 22×2 (100) FEP
GL-1200

ハードボ-ル 600×1200
600⁺中耐重フタ付

2灯用灯具撤去・更新 (ポール既存再使用)
既存器具型番: ヤマギワ U0645~2台

GL-1200

CV8^C×3 CVV125-5^C×5 (100) FEP
GL-600


CVV125-5^C×5 (既存首)
CVV125-5^C×5 (28) PF×2

CV8^C×5 E55(50)

④ CV55-3^C×3 (100) FEP
CVT 22×2 (100) FEP
GL-600

Box内ケーブル系統
(PB150×100 WIP スペース) 2ヶ

1灯用灯具撤去・更新 (ポール既存再使用)
既存器具型番: ヤマギワ U0646~6台

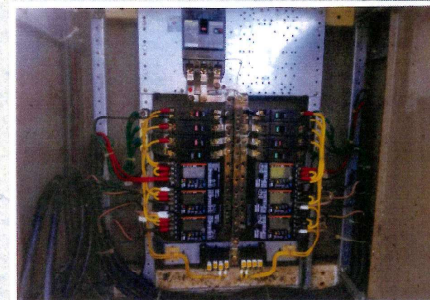

L-A改修内容

1. ソーラータイマー (6個) 交換 (1個) 追加
2. 盤内整線・整備
3. 絶縁不良回路の改修 (今回工事範囲のみ)

CV55-3^C (30) FEP
GL-1200

⑧ CVT 22^C
CVT 22^C CVV125-5^C
CV55-3^C (100) FEP
GL-600
CVT 22^C CV55-3^C (100) FEP
GL-600

24h式ソーラータイマー×6台撤去・更新, 1個追加
盤内整備・絶縁改修

ハードボ-ル 600×300
600⁺中耐重フタ付

CVT 22^C CV55-3^C×6 (80) FEP
GL-600

CV55-3^C×4 (100) FEP
CVT 22×2 (100) FEP
GL-600

該当する既設ケーブル撤去・更新
更新ケーブルEM-CE3.5sq-3C 及びEM-CE3.5-4C

1灯用更新器具参考型番
パナソニック
G 灯具: NYG2124NK×6
電源ユニット: NNY28729LE9×6
1灯用アーム: DYDX2001×6

2灯用更新器具参考型番
パナソニック
N 灯具: NYG2124NK×4
電源ユニット: NNY28729LE9×4
2灯用アーム: DYDX2002×2

既設配置図による施工範囲図 S=1:500
